



Työmaan viikkotiedote

40070 OYS2030 Sädehoityksikkö UR2
vk9/2021



Pohjois-Suomen hiihtolomaviikon alla saatiin purettua vesikaton sääsuoja ja vesikattotyöt tulivat maaliin tältä erää. Vesikatto saa lopullisen pintansa keväämmällä, kelien salliessa. Ulkotöistä jatkettiin ulkoseinillä termorankaseinien parissa.

T-kerroksessa saatiin käyntiin tasoite- ja maalaustyöt. 0-kerroksessa lattiavalut etenivät ja valmista valumestaa on nousuviikollekin.

1-kerroksessa muurattavat väliseinät pääsivät jatkumaan pienen tauon jälkeen ja kipsilevyseinät etenivät hurjaa vauhtia.

Talotekniikkaporukka edisti omia töitään niin LVI-töiden osalta 0- ja 1-kerroksessa kuin sähkötöiden puolesta 1-kerroksessa.

Työmaalla sattui kuluneella viikolla myös valitettava työtapaturma, kun yhden työmaan henkilön nilkka vääntyi.

Ensi viikolla osa porukasta viettää talvilomaa ja tästä johtuen myös työmaan viikkotiedote on levähdystauolla viikon päivät. Työt jatkuvat kuitenkin ja uusina työvaiheina käynnistyvät lattioiden pinnoitus teknisten tilojen osalta, pölynsuojamaalaus 1-kerroksessa sekä sprinklerurakoitsija käynnistää oman suorituksensa. Muuten jatketaan käynnissä olevien töiden parissa.



HARTELA

Työturvallisuus


- Viikon 9 TR-mittauksen tulos oli 93,31% (ulkoinen mittaus)
- Tapaturmattomia työpäiviä 2.3.2020 lähtien 5.3 mennessä 4 kpl
- Työnjohdon viikkopalaveri pidetty
- Työntekijöiden viikkopalaveri pidetty
- Huolehditaan työmaan riittävästä liukkauden torjunnasta ja valaistuksesta

Käynnissä olevat työsuoritteet

- T-kerroksen maalaus- ja tasoitetyöt
- 0-kerroksen maanvaraisten ja pintabetonilattioiden valmistelevat sekä valutyöt
- 0-kerroksen viemäroinnit ja lattialämmitykset
- 1-kerroksen väliseinämuuraukset
- 1-kerroksen kipsilevyväliseinät
- 1-kerroksen väliseinien sähköputkitukset
- Termorankaseinät
- Vesikaton puutyöt



1-kerroksessa kipsilevyväliseinät hyvässä vauhdissa

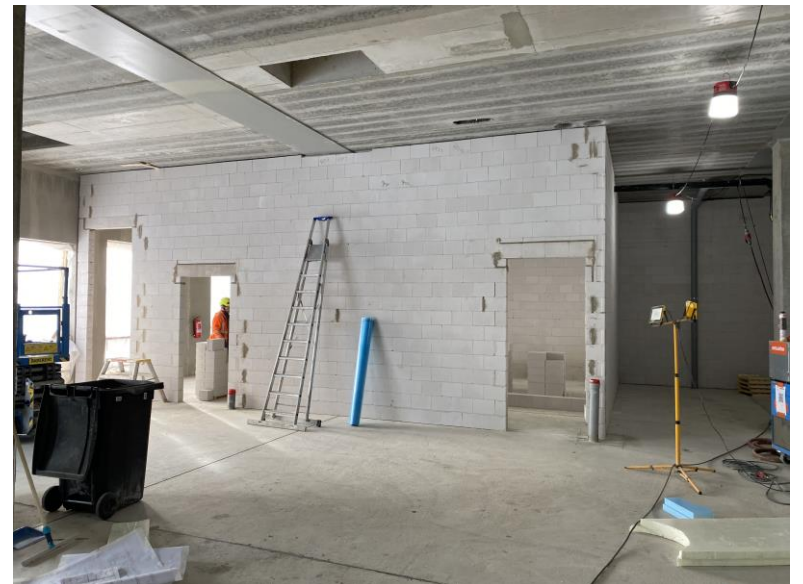

Myös muurattavat väliseinät etenevät hyvin 1-kerroksessa



Valmiit työsuoritteet

- T-kerroksen sähköputkitukset ja sähköhyllyt
- T-kerroksen tavarahissin purku
- 1-kerroksen pintabetonilaatat
- 1-kerroksen viemäröinnit ja lattialämmitykset
- Vesikattotyöt
- Säasuojan purku

Tulevat työsuoritteet

- 1-kerroksen pölysuojamaalaus
- Sprinklerit
- IV-konehuoneen ja muuntamon lattioiden pinnoitus



T-kerroksessa kuorruteltiin seiniä



Vesikattotyöt jäävät nyt tauolle kevääseen saakka



Haitat työmaalle tai ympäristölle

- Huomioidaan työmaan lähiliikenne sekä työmaan lähialueen toimijoiden henkilökunta ja asiakkaat
- Sädehoitoyksikön työmaalle tulee runsaasti materiaalikuormia. Työmaaliikenteestä aiheutuu jonkin verran häiriötä, mutta pyrimme minimoimaan haitat
- Mikäli työt aiheuttavat liiallista häiriötä, pyydämme Teitä olemaan välittömästi yhteydessä työmaan henkilökuntaan

Muuta tiedotettavaa


- Työmaalle on laadittu toimintaohjeet Koronaviruksen varalta. Koronalla ei ole ollut vaikutuksia työmaan aikatauluun.
 - Työmaatiloissa käytetään kasvomaskia, poikkeuksena kahvi- ja ruokatauot. Työmaalla maskia käytetään aina kun siitä ei aiheudu vaaraa
 - Työmaakäynneistä ja työmaalle tulosta on ilmoitettava etukäteen työmaan työnjohdolle
 - Työmaatoimiston ovi on toistaiseksi lukittuna myös päivisin



ystävällisin terveisin

Sädehoitoyksikön työmaan työnjohto

Toni, Pasi, Juho ja Niko



HARTELA

Lisätietoja hankkeesta:
Vastaava työnjohtaja Toni Päckilä
toni.pakkila@hartela.fi
040 704 4236
